

Compte-rendu de réunion de chantier du vendredi 02 septembre 2022
Titulaire du marché : DIEBOLT TP

➤ **Personnes présentes**

Structure	Personne	Téléphone	Présence réunion	Prochaine réunion	Diffusion
Maître d'ouvrage : Commune de SAALES	M. MANGENET	06 87 35 39 44	P	I	r.mangenet@saales.fr
	Membres de la CM				secretariat@saales.fr
Titulaires du marché : DIEBOLT TP	M. GOBERT	06 19 07 23 43	P	C	mgobert@diebolt-tp.fr
	M. IBALVA	06 14 47 10 37			lbalva@diebolt-tp.fr
Maître d'œuvre : V2EC	M. GRANDJEAN	06 78 46 06 30			a.grandjean@valterra.fr
CD 67	M. LANTZ		A	I	emmanuel.lantz@alsace.eu
Contrôles extérieurs	M. PHILIPPE, Inera	06 22 11 37 02	A	I	m.philippe@inera-ge.com

➤ **Travaux**

L'entreprise DIEBOLT a commencé les travaux sur la « rue Sainte-Barbe » à partir du lundi 29 août 2022. La déviation a été mise en place par les services du CD67. Les travaux s'effectuent en route barrée. Une cinquantaine de mètres a été posée à ce jour (tronçon EU1 – Existant et EP1 – Existant).




Réseau posé et croisement avec la conduite AEP




Boîtes de branchement à ne pas poser

La conduite AEP a été rencontrée dans la fouille à la même profondeur que les réseaux à poser. Il a été décidé de modifier la pente des réseaux EP et EU pour passer au-dessus de la conduite d'eau, afin de ne pas la fragiliser.

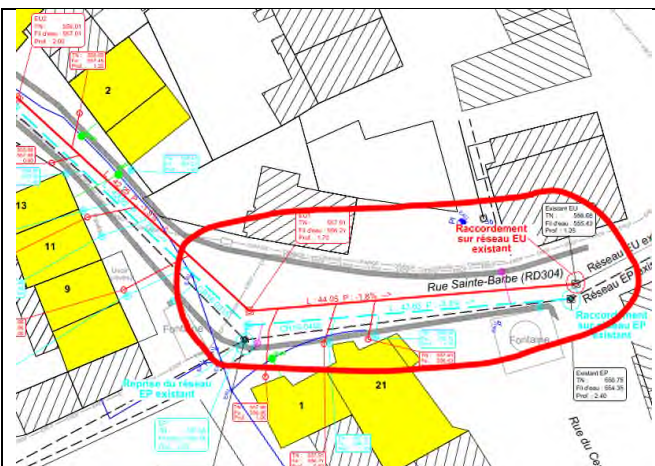

Réseau posé et croisement avec la conduite AEP

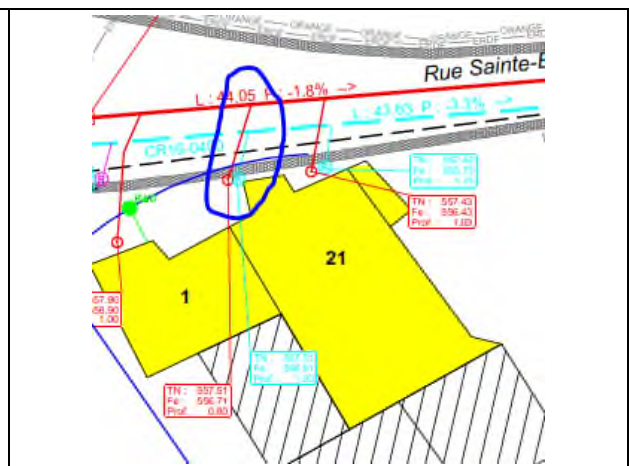

Boîtes de branchement à ne pas poser


Pour l'immeuble n°21 « rue du Centre », suite aux modifications des évacuations des eaux usées faites par les propriétaires, une seule boîte de branchement EU sera posée. Le raccordement d'une descente de toiture sera réalisé sans la pose d'une boîte de branchement EP (raccordement en direct sur le réseau EP).

Rappel à l'entreprise DIEBOLT :

Toutes les évacuations existantes (eaux usées et eaux pluviales) seront raccordées dans le nouveau réseau pluvial, dans l'attente des reprises des eaux usées sur le domaine privé afin de conserver la continuité des écoulements actuels.

➤ **Divers**

L'entreprise DIEBOLT fournira un devis pour raccorder 2 descentes de toiture dans le nouveau réseau EP s'écoulant actuellement sur le caniveau (apparition de plaques verglacées en hiver), en se basant sur les prix du marché.

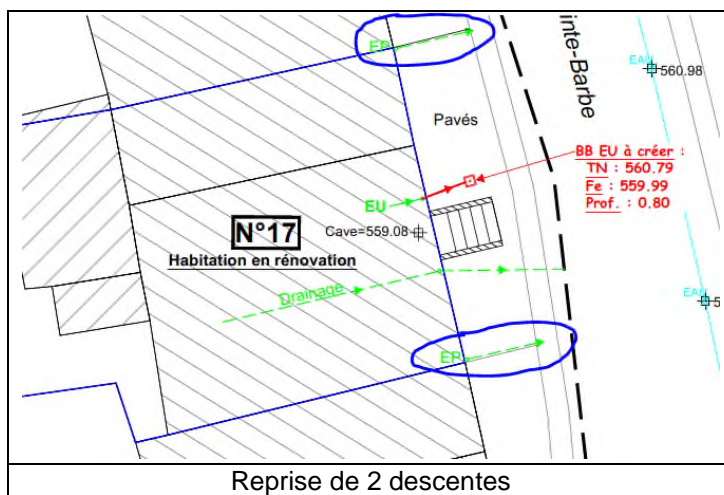

➤ **Prochaine réunion de chantier**

Le jeudi 08 septembre 2022 à 14h00 sur le chantier.
