


Compte-rendu de réunion de chantier n°5 du jeudi 29 septembre 2022 – Indice A
Titulaire du marché : DIEBOLT TP

➤ **Personnes présentes**

Structure	Personne	Téléphone	Présence réunion	Prochaine réunion	Diffusion
Maître d'ouvrage : Commune de SAALES	M. MANGENET	06 87 35 39 44	A	I	r.mangenet@saales.fr
	Membres de la CM		P		secretariat@saales.fr
Titulaires du marché : DIEBOLT TP	M. GOBERT, conducteur de travaux	06 19 07 23 43	P	C	mgobert@diebolt-tp.fr
	M. LITTNER, chef de chantier	06 76 03 76 32	P		
Maître d'œuvre : V2EC	M. GRANDJEAN	06 78 46 06 30	P		a.grandjean@valterra.fr
CD 67	M. LANTZ		A	I	emmanuel.lantz@alsace.eu
Contrôles extérieurs	M. PHILIPPE, Inéra	06 22 11 37 02	A	I	m.philippe@inera-ge.com

➤ **Travaux**

Il reste une antenne à créer pour raccorder l'immeuble n°10 de la « rue Sainte-Barbe » et deux immeubles à raccorder.

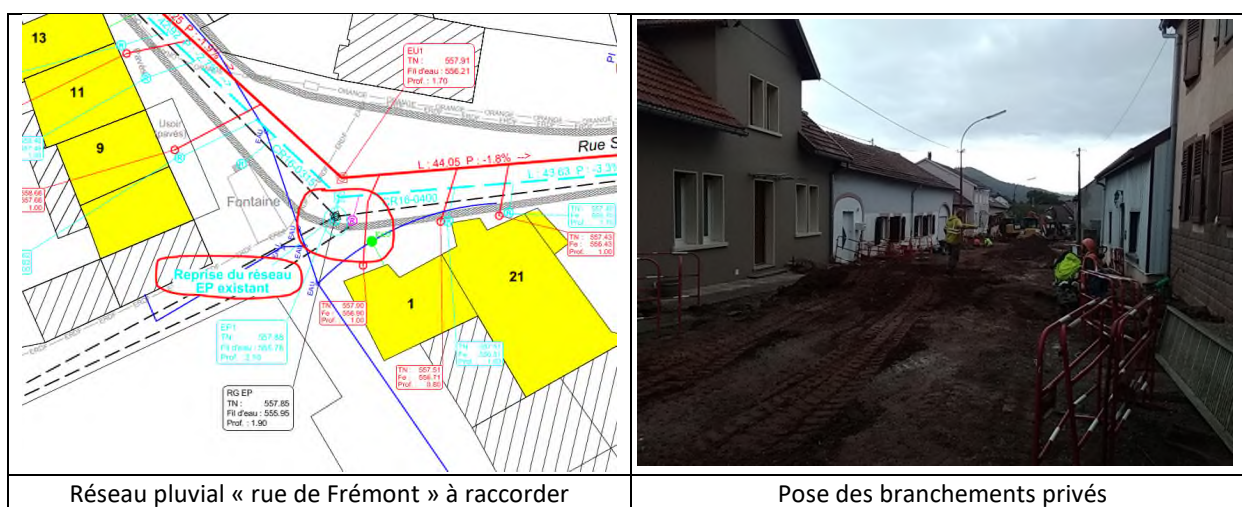

Réseau pluvial « rue de Frémont » à raccorder

Pose des branchements privés

Mise à niveau de tous les ouvrages (regards, boucle à clé) à faire.

Comblement de l'ancien réseau pluvial à réaliser.

Reprise du réseau pluvial provenant de la « rue de Frémont » et changement de la grille avaloir et raccordement sur le nouveau réseau EP à faire.

Remise en état des caniveaux en pavés et des usoirs en cours.

Les derniers contrôles externes seront réalisés à partir du vendredi 30 septembre 2022 (compactage, étanchéité et caméra).

Décaissement et reprofilage de la tranchée avec mise en œuvre de 2 couches de GNT 0/31.5 avant la réfection en bi-couche comme stipulé dans la permission de voirie.

➤ **Consignes à l'entreprise**

Réaliser un curage du réseau d'eaux usées et des boîtes de branchement avant les passages caméra et pour protéger le poste de refoulement situé en aval du réseau de collecte.

Pour le week-end l'entreprise veillera à assurer la continuité des écoulements.

➤ **INERA**

Prendre contact avec M. IBARS Christophe – service technique de SAALES (06-79-72-84-50) pour les prises d'eau sur les poteaux incendie.

➤ **Décisions**

La pose du bi-couche est prévu le mardi 4 octobre 2022.

➤ **Prochaine réunion de chantier**

Le jeudi 06 octobre 2022 à 14h00 sur le chantier.
