

Compte-rendu de réunion de chantier n°7 du vendredi 21 octobre 2022
Titulaire du marché : Groupement HYDREA – PEDUZZI SAS – VILLAUME André et Fils

➤ **Personnes présentes**

Structure	Personne	Téléphone	Présence réunion	Prochaine réunion	Diffusion
Maître d'ouvrage : Commune de SAALES	M. MANGENET	06 87 35 39 44	A	I	r.mangenet@saales.fr
	Membres de la CM		P	I	secretariat@saales.fr
Titulaires du marché	M. FRITZ, Hydréa	06 89 10 71 36	P	C	jerome.fritz@suez.com
	M. GATER, Hydréa				Abderrahim.gater@suez.com
	M. LIVERA, Peduzzi	06 08 73 20 74	P	C	rlivera@groupe-livio.com
	M. VILLAUME, Villaume	06 73 98 26 44	A	C	villaumeetfils@wanadoo.fr
Agence de l'eau	M. LALOE			I	julien.laloe@eau-rhin-meuse.fr
Police de l'eau	M. BONIS			I	bruno.bonis@bas-rhin.gouv.fr
CSPS	M. SERUGUE			I	alain.serugue@bureauveritas.com
CT	M. GIORGI	06 09 58 98 57	P	I	bernard.giorgi@socotec.com
Inspection du travail	M. MZIOU		P	I	hamda.mziou@bas-rhin.gouv.fr
Maître d'œuvre : V2EC	M. GRANDJEAN	06 78 46 06 30	P		a.grandjean@valterra.fr

➤ **Point sur la période de préparation**

Le contrôleur technique a validé les plans de ferrailage des poteaux, poutres, regard de répartition, passerelle et dégrilleur.

L'entreprise PEDUZZI a transmis au CT et à V2EC la fiche produit pour le traitement des fissures du radier des SBR => en attente de la réponse du Contrôleur Technique.

L'entreprise HYDREA a fourni ce jour un détecteur 4 gaz à la commune.

➤ **Travaux**

Les voiles des locaux techniques (local électrique et local surpresseur) ont été décoffrés.

Le poste toutes eaux a été installé.

La dalle au-dessus des bacs à graisses et sable, le regard de répartition, la passerelle au-dessus des cellules des SBR ont été coulés.

Le DDC a été livré mais il est non conforme par rapport projet. Il sera remplacé, ce qui implique un retard dans l'organisation de PEDUZZI.




Regard de répartition coulé



DDC à démonter (réservations non conformes)

L'entreprise HYDREA fournit à PEDUZZI les manchettes pour les traversées des parois.
 Préparation du ferrailage du dégrilleur.

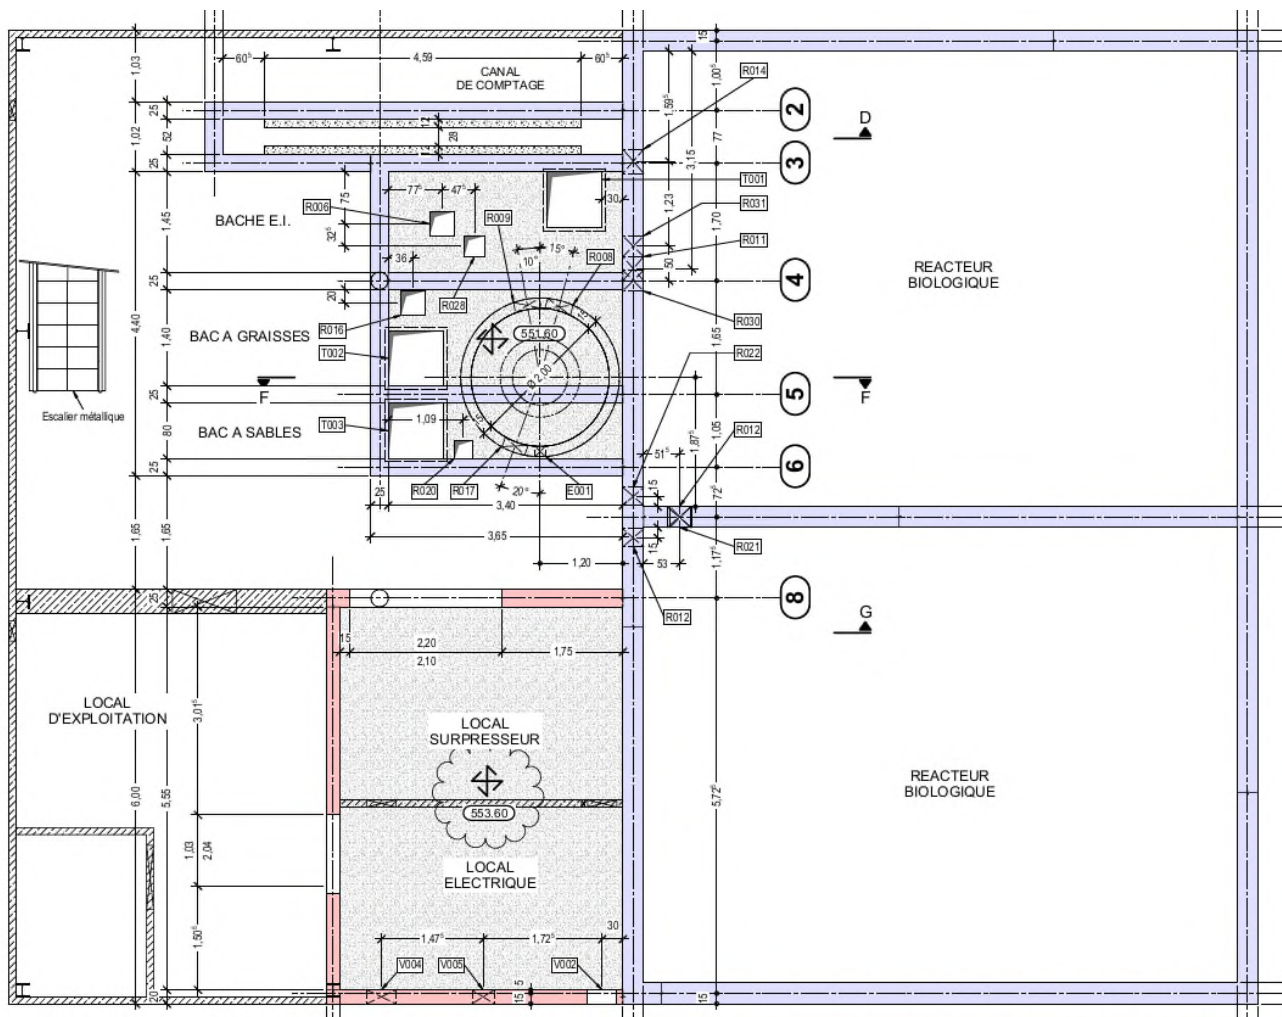

➤ **SPS**

RAS

➤ **Contrôleur technique**

Transmettre à PEDUZZI l'avis sur le produit proposé pour traiter les fissures du radier des SBR.

➤ **Décisions**

La commune souhaite conserver la clôture et le portail qui seront démontés pour la couverture du poste de refoulement.

HYDREA se renseigne sur les aides que la Commune pourrait obtenir pour la mise en œuvre de variateurs de fréquence => économies d'énergie.

Remplissage en eau d'une cellule de SBR pour la réalisation des essais d'étanchéité des pieds de voiles (remplissage d'1 mètre environ) selon les ressources en eau disponibles => les services techniques tiendront informés l'entreprise sur les possibilités de remplissage (date, durée, débit, ...).

➤ **Divers**

HYDREA recherche un prestataire local (pépiniériste) pour la plantation des roseaux sur les filtres de séchage.

Rappel : Entretien le chemin d'accès à la STEP (recharger en matériau le flache au niveau de l'ancien PR).

➤ **Prochaine réunion de chantier**

Le vendredi 18 novembre 2022 à 9h00 sur chantier.
